J. Dobler GmbH & Co.
Bauunternehmung
Ellgassen 4
88161 Lindenberg
Tel.: 08381/ 8908-0

Bauzeitplan

Plan - Nr.: 1

Bauvorhaben: Bahnübergang Langenweg Lindau , Kreisverkehr Kolpingstr. , VORENTWURF
Stadt Lindau

Erstellt / geändert: Jürgen Marcolla 18.07.2016 /

Geprüft.:

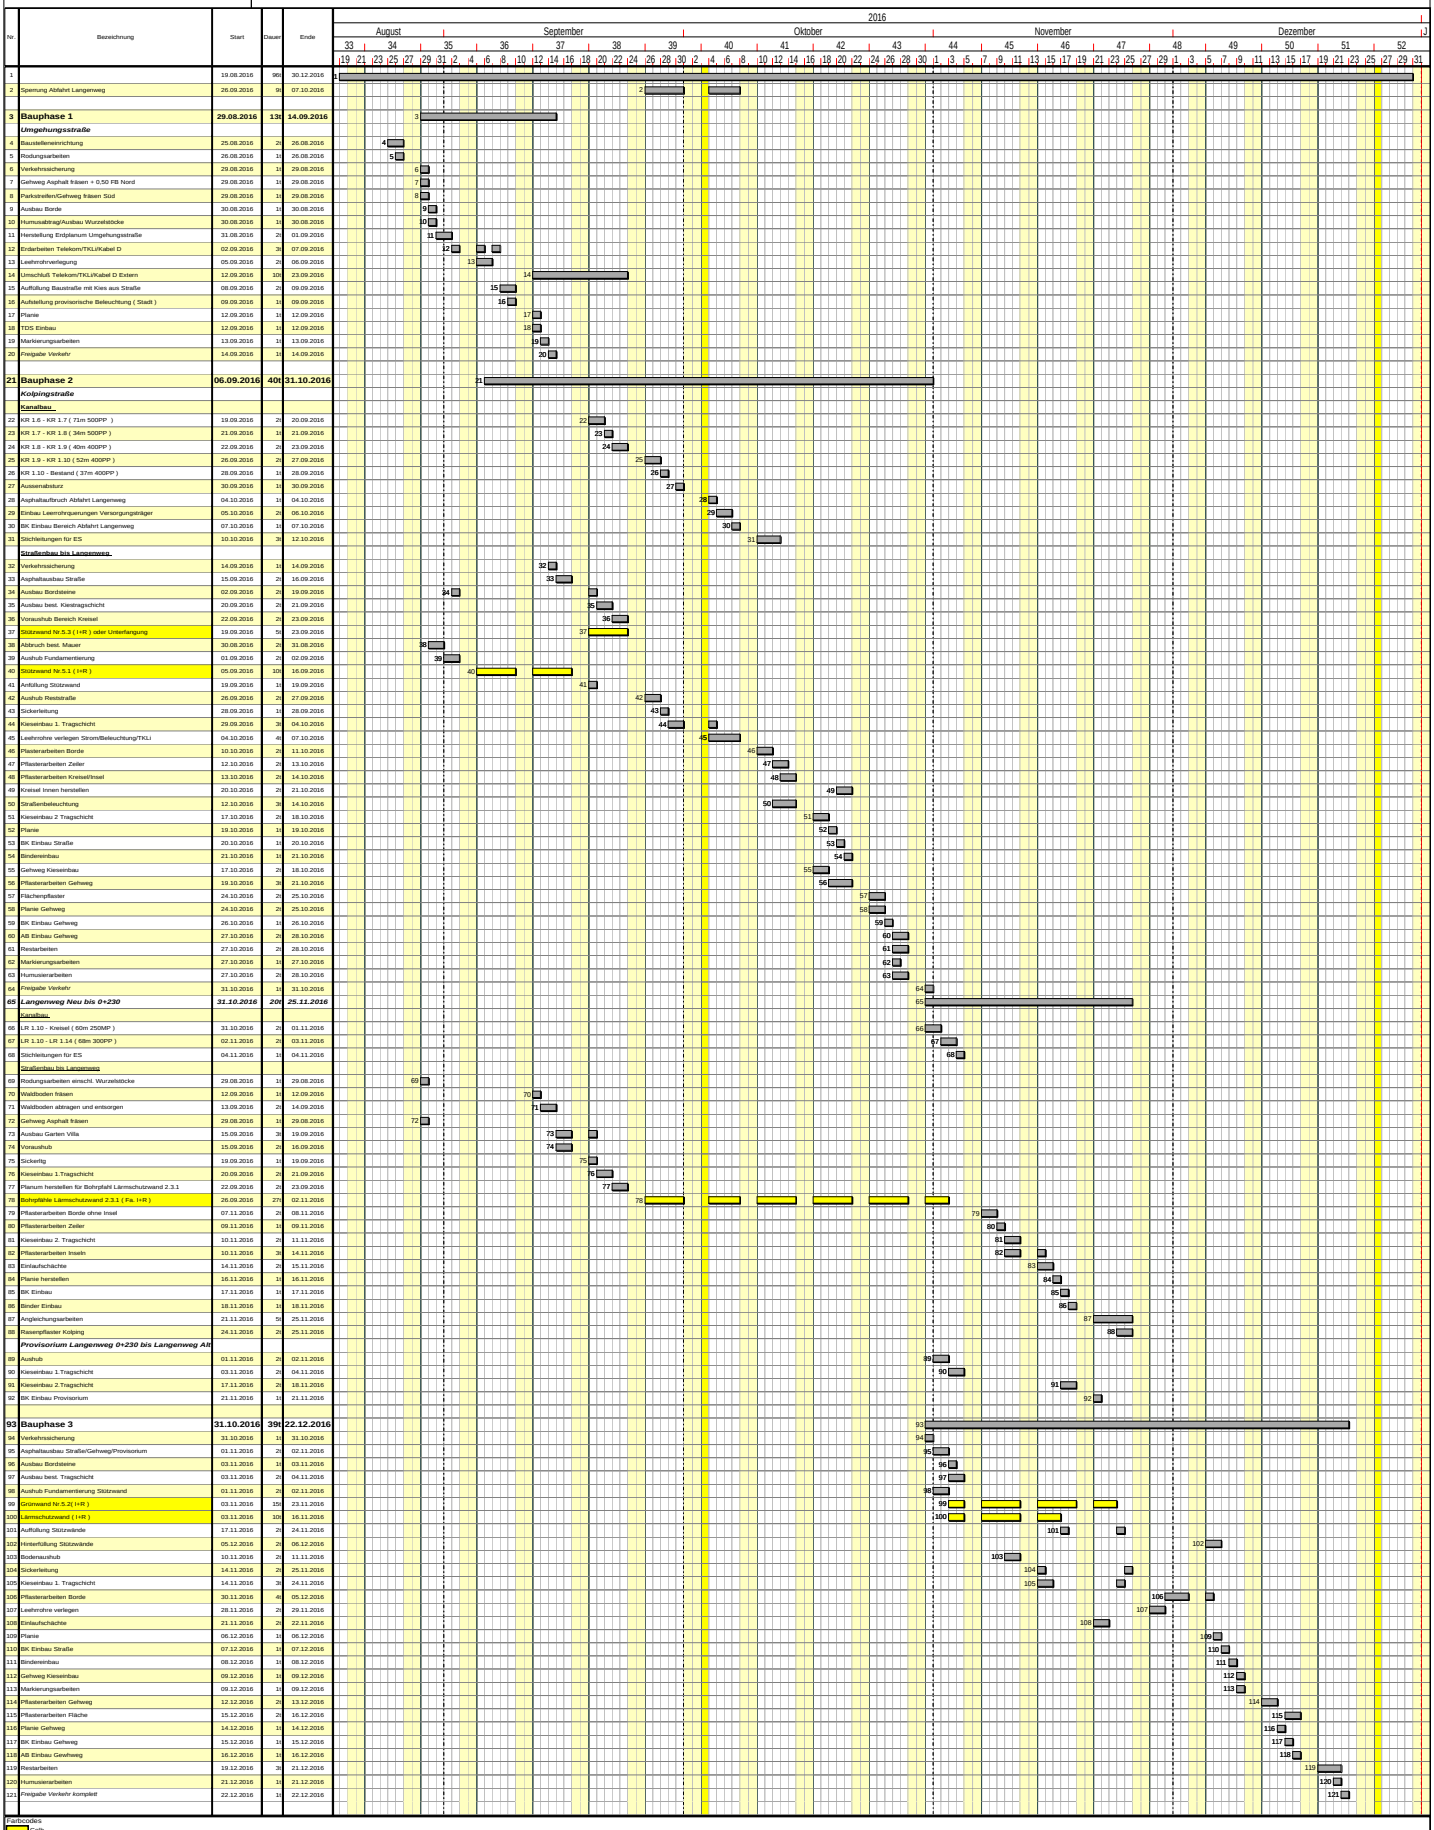

Nr.	Bezeichnung	Start	Dauer	Ende
1		19.08.2016	96t	30.12.2016
2	Sperrung Abfahrt Langenweg	26.09.2016	9t	07.10.2016
3	**Bauphase 1**	**29.08.2016**	**13t**	**14.09.2016**
	Umgehungsstraße			
4	Baustelleneinrichtung	25.08.2016	2t	26.08.2016
5	Rodungsarbeiten	26.08.2016	1t	26.08.2016
6	Verkehrssicherung	29.08.2016	1t	29.08.2016
7	Gehweg Asphalt fräsen + 0,50 FB Nord	29.08.2016	1t	29.08.2016
8	Parkstreifen/Gehweg fräsen Süd	29.08.2016	1t	29.08.2016
9	Ausbau Borde	30.08.2016	1t	30.08.2016
10	Humusabtrag/Ausbau Wurzelstöcke	30.08.2016	1t	30.08.2016
11	Herstellung Erdplanum Umgehungsstraße	31.08.2016	2t	01.09.2016
12	Erdarbeiten Telekom/TKLi/Kabel D	02.09.2016	3t	07.09.2016
13	Leehrohrverlegung	05.09.2016	2t	06.09.2016
14	Umschluß Telekom/TKLi/Kabel D Extern	12.09.2016	10t	23.09.2016
15	Auffüllung Baustraße mit Kies aus Straße	08.09.2016	2t	09.09.2016
16	Aufstellung provisorische Beleuchtung (Stadt)	09.09.2016	1t	09.09.2016
17	Planie	12.09.2016	1t	12.09.2016
18	TDS Einbau	12.09.2016	1t	12.09.2016
19	Markierungsarbeiten	13.09.2016	1t	13.09.2016
20	Freigabe Verkehr	14.09.2016	1t	14.09.2016
21	**Bauphase 2**	**06.09.2016**	**40t**	**31.10.2016**
	Kolpingstraße			
	Kanalbau			
22	KR 1.6 - KR 1.7 (71m 500PP)	19.09.2016	2t	20.09.2016
23	KR 1.7 - KR 1.8 (34m 500PP)	21.09.2016	1t	21.09.2016
24	KR 1.8 - KR 1.9 (40m 400PP)	22.09.2016	2t	23.09.2016
25	KR 1.9 - KR 1.10 (52m 400PP)	26.09.2016	2t	27.09.2016
26	KR 1.10 - Bestand (37m 400PP)	28.09.2016	1t	28.09.2016
27	Aussenabsturz	30.09.2016	1t	30.09.2016
28	Asphaltaufbruch Abfahrt Langenweg	04.10.2016	1t	04.10.2016
29	Einbau Leerrohrqueurungen Versorgungsträger	05.10.2016	2t	06.10.2016
30	BK Einbau Bereich Abfahrt Langenweg	07.10.2016	1t	07.10.2016
31	Sichleitungen für ES	10.10.2016	3t	12.10.2016
	Straßenbau bis Langenweg			
32	Verkehrssicherung	14.09.2016	1t	14.09.2016
33	Asphaltausbau Straße	15.09.2016	2t	16.09.2016
34	Ausbau Bordsteine	02.09.2016	2t	19.09.2016
35	Ausbau best. Kiestragschicht	20.09.2016	2t	21.09.2016
36	Voraushub Bereich Kreisel	22.09.2016	2t	23.09.2016
37	Stützwand Nr.5.3 (I+R) oder Unterfangung	19.09.2016	5t	23.09.2016
38	Abbruch best. Mauer	30.08.2016	2t	31.08.2016
39	Aushub Fundamentierung	01.09.2016	2t	02.09.2016
40	Stützwand Nr.5.1 (I+R)	05.09.2016	10t	16.09.2016
41	Anfüllung Stützwand	19.09.2016	1t	19.09.2016
42	Aushub Reststraße	26.09.2016	2t	27.09.2016
43	Sickerleitung	28.09.2016	1t	28.09.2016
44	Kieseinbau 1. Tragschicht	29.09.2016	3t	04.10.2016
45	Leehrohre verlegen Strom/Beleuchtung/TKLi	04.10.2016	4t	07.10.2016
46	Pflasterarbeiten Borde	10.10.2016	2t	11.10.2016
47	Pflasterarbeiten Zeller	12.10.2016	2t	13.10.2016
48	Pflasterarbeiten Kreisel/Insel	13.10.2016	2t	14.10.2016
49	Kreisel Innen herstellen	20.10.2016	2t	21.10.2016
50	Straßenbeleuchtung	12.10.2016	3t	14.10.2016
51	Kieseinbau 2.Tragschicht	17.10.2016	2t	18.10.2016
52	Planie	19.10.2016	1t	19.10.2016
53	BK Einbau Straße	20.10.2016	1t	20.10.2016
54	Bindereinbau	21.10.2016	1t	21.10.2016
55	Gehweg Kieseinbau	17.10.2016	2t	18.10.2016
56	Pflasterarbeiten Gehweg	19.10.2016	3t	21.10.2016
57	Flächenpflaster	24.10.2016	2t	25.10.2016
58	Planie Gehweg	24.10.2016	2t	25.10.2016
59	BK Einbau Gehweg	26.10.2016	1t	26.10.2016
60	AB Einbau Gehweg	27.10.2016	2t	28.10.2016
61	Restarbeiten	27.10.2016	2t	28.10.2016
62	Markierungsarbeiten	27.10.2016	1t	27.10.2016
63	Humusierarbeiten	27.10.2016	2t	28.10.2016
64	*Freigabe Verkehr*	31.10.2016	1t	31.10.2016
65	***Langenweg Neu bis 0+230***	***31.10.2016***	***20t***	***25.11.2016***
	Kanalbau			
66	LR 1.10 - Kreisel (60m 250MP)	31.10.2016	2t	01.11.2016
67	LR 1.10 - LR 1.14 (68m 300PP)	02.11.2016	2t	03.11.2016
68	Sichleitungen für ES	04.11.2016	1t	04.11.2016
	Straßenbau bis Langenweg			
69	Rodungsarbeiten einschl. Wurzelstöcke	29.08.2016	1t	29.08.2016
70	Waldboden fräsen	12.09.2016	1t	12.09.2016
71	Waldboden abtragen und entsorgen	13.09.2016	2t	14.09.2016
72	Gehweg Asphalt fräsen	29.08.2016	1t	29.08.2016
73	Ausbau Garten Villa	15.09.2016	3t	19.09.2016
74	Voraushub	15.09.2016	2t	16.09.2016
75	Sickertig	19.09.2016	1t	19.09.2016
76	Kieseinbau 1.Tragschicht	20.09.2016	2t	21.09.2016
77	Planum herstellen für Bohrpfahl Lärmschutzwand 2.3.1	22.09.2016	2t	23.09.2016
78	Bohrpfähle Lärmschutzwand 2.3.1 (Fa. I+R)	26.09.2016	27t	02.11.2016
79	Pflasterarbeiten Borde ohne Insel	07.11.2016	2t	08.11.2016
80	Pflasterarbeiten Zeller	09.11.2016	1t	09.11.2016
81	Kieseinbau 2. Tragschicht	10.11.2016	2t	11.11.2016
82	Pflasterarbeiten Inseln	10.11.2016	3t	14.11.2016
83	Einlaufschächte	14.11.2016	2t	15.11.2016
84	Planie herstellen	16.11.2016	1t	16.11.2016
85	BK Einbau	17.11.2016	1t	17.11.2016
86	Binder Einbau	18.11.2016	1t	18.11.2016
87	Angleichungsarbeiten	21.11.2016	5t	25.11.2016
88	Rasenpflaster Kolping	24.11.2016	2t	25.11.2016
	Provisorium Langenweg 0+230 bis Langenweg AB			
89	Aushub	01.11.2016	2t	02.11.2016
90	Kieseinbau 1.Tragschicht	03.11.2016	2t	04.11.2016
91	Kieseinbau 2.Tragschicht	17.11.2016	2t	18.11.2016
92	BK Einbau Provisorium	21.11.2016	1t	21.11.2016
93	**Bauphase 3**	**31.10.2016**	**39t**	**22.12.2016**
94	Verkehrssicherung	31.10.2016	1t	31.10.2016
95	Asphaltausbau Straße/Gehweg/Provisorium	01.11.2016	2t	02.11.2016
96	Ausbau Bordsteine	03.11.2016	1t	03.11.2016
97	Ausbau best. Tragschicht	03.11.2016	2t	04.11.2016
98	Aushub Fundamentierung Stützwand	01.11.2016	2t	02.11.2016
99	Grünwand Nr.5.2(I+R)	03.11.2016	15t	23.11.2016
100	Lärmschutzwand (I+R)	03.11.2016	10t	16.11.2016
101	Auffüllung Stützwände	17.11.2016	2t	24.11.2016
102	Hinterfüllung Stützwände	05.12.2016	2t	06.12.2016
103	Bodenaushub	10.11.2016	2t	11.11.2016
104	Sickerleitung	14.11.2016	2t	25.11.2016
105	Kieseinbau 1. Tragschicht	14.11.2016	3t	24.11.2016
106	Pflasterarbeiten Borde	30.11.2016	4t	05.12.2016
107	Leehrohre verlegen	28.11.2016	2t	29.11.2016
108	Einlaufschächte	21.11.2016	2t	22.11.2016
109	Planie	06.12.2016	1t	06.12.2016
110	BK Einbau Straße	07.12.2016	1t	07.12.2016
111	Bindereinbau	08.12.2016	1t	08.12.2016
112	Gehweg Kieseinbau	09.12.2016	1t	09.12.2016
113	Markierungsarbeiten	09.12.2016	1t	09.12.2016
114	Pflasterarbeiten Gehweg	12.12.2016	2t	13.12.2016
115	Pflasterarbeiten Fläche	15.12.2016	2t	16.12.2016
116	Planie Gehweg	14.12.2016	1t	14.12.2016
117	BK Einbau Gehweg	15.12.2016	1t	15.12.2016
118	AB Einbau Gehrweg	16.12.2016	1t	16.12.2016
119	Restarbeiten	19.12.2016	3t	21.12.2016
120	Humusierarbeiten	21.12.2016	1t	21.12.2016
121	*Freigabe Verkehr komplett*	22.12.2016	1t	22.12.2016

Farbcodes
Gelb
